

專案報告

丹娜絲颱風及0728豪雨災害 各區災後重建執行情形

臺南市政府
114年9月30日



災後修繕
我們持續努力

補助最高3萬元上工津貼

鼓勵廠商投入災區修繕，加速災民重建家園

整合全台修繕能量

與營造業公會合作，雙站可投入人力與資源，全面啟動協助支援

家園復原慰助金，協助民宅修繕

依屋頂外立面補助金額最高10萬元，台南實波款項已入帳

災後動員8400人力投入現場

由國防部、環地部與各級政府人力，一同協助災民重建

內政部



修繕簽約獎勵金

期限延長至8/31

台南受災戶數眾多，簽約期限延
續更多家庭趕上重建進度！



面對考驗 展現愛與力量...




簡報 大綱

- 壹、前言
- 貳、關懷與照顧
- 參、重建進度
- 肆、治水防洪
- 伍、公共設施復建
- 陸、特別預算
- 柒、結語


極端氣候 嚴峻考驗

- 丹娜絲颱風為1958年來首度自嘉義登陸並重創臺南，7月6日沿海出現16級陣風，造成逾30萬戶停電、5萬戶屋損、超過2,400支電桿及2.7萬棵樹木倒塌，災情為半世紀最嚴峻。市府災害應變中心開設長達278小時，超越歷年紀錄，並與國軍、台電等單位合作，24小時內搶通128條主要道路，確保物資運送。
- 7月28日及8月2日臺南受西南氣流影響，持續豪雨一週，影響時間長、範圍廣且期間內多次短延時強降雨等特色，自1,998年以來首見連續7天單日測站雨量達豪雨等級，總雨量直逼極端降雨量最多的98年莫拉克颱風。
- 臺南最大累積降雨量在關山2,019mm，名列全國第3，而在8月2日~8月3日共24小時內，最大累積雨量在安定區395.5mm(超過200頻率)；最大3小時累積雨量也是安定區234mm(超過500頻率)；最大1小時累積雨量在永康區103.5mm(超過500頻率)，皆已超過設計標準，造成臺南大範圍淹水，但雨勢一小積水立即消退，當日總淹水面積僅為130公頃，遠少於莫拉克風災時的55,000公頃，顯見臺南投入治水工程已發揮成效。

丹娜絲颱風0706~0707各行政區最大陣風分布圖

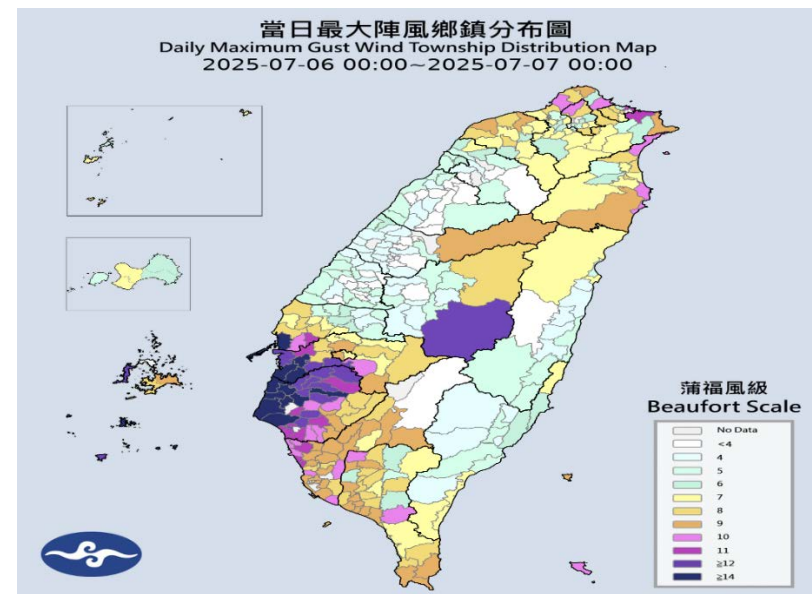

0728~0804各行政區天氣警特報

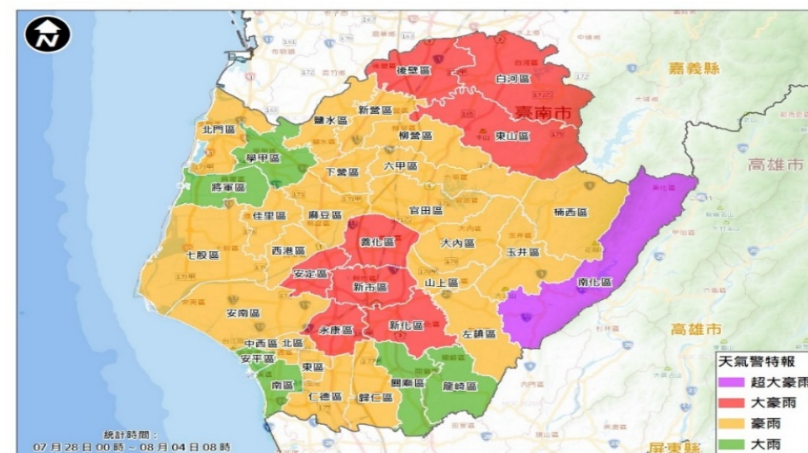

中央與地方攜手 資源整合

- 為加速復原，**行政院在臺南成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」**，由**政委陳金德召集中央部會**，建立民房修繕機制、認養災區並投入資源，已召開**15次會議**。
- **市長召集相關局處每日親自主持「復原工作會議」**，已連續召開**30次**，並舉行**23次記者會**以安定民心。
- **中央與地方整合所有資源**，全力協助災民盡速重建家園，恢復正常生活。



- 對人的救助**6,216萬5,000元**
 - 車輛、住屋慰助**12億7,522萬504元**
 - 農、漁、畜損現金救助金額約**18億4,946萬元**
- 共計31億8,684萬5,504元**



- 各界捐款總計**2億4,634萬8,475元**
- 重大災害賑災專戶匡列補助計畫總計**4億8,632萬元**

統計至114.9.26



住屋慰助金從速、從實

案件核撥率**100%**

住屋毀損慰助金 核撥情形	未達20M ²	20M ² ~未達 100M ²	100M ² 以上	合計
累計核撥件數	30,748	14,386	2,468	47,602
累計核撥金額	295,124,000	689,555,000	239,245,000	12億2,392萬4000元

統計至114.9.23



➤ 為加速民眾申辦成立11區公所聯合服務中心，20局處共出動3,593人次，受理各類案件逾4萬6,000件

加速家園復原重建補助

項 目		補 助 內 容				來 源
		100平方公尺以上	20平方公尺以上 未達100平方公尺	未達20平方公尺		
經費來源		行政院		臺南市政府	行政院	特別統籌分配稅款
家園復原慰助金	弱勢戶	上限10萬元	上限5萬元	1.5萬元	1.5萬元	
	一般戶			1萬元	NEW 1萬元	
NEW 弱勢戶生活支持補助金		10萬元		3萬元		賑災基金會
弱勢戶自行修繕補助金 (有居住事實)受理期限至10/31		10萬元	5萬元			特別預算
弱勢戶媒合修繕補助 媒合期限至09/30		政府全額負擔辦理				
一般戶媒合修繕 簽約獎勵金 簽約期限至9/30	第一波9/02前簽約	補助工程尾款2萬元				
	第二波10/06前簽約	補助工程尾款1.5萬元				
拆除補助 拆除期限至10/31	媒合工班代拆	政府全額負擔辦理				
	自行雇工	2萬元				
上工津貼		3萬元	1.5萬元			特別統籌分配款

善款運用及弱勢戶關懷

啟動弱勢戶一戶一社工服務、志工團體總動員



重大災害賑災專戶匡列補助計畫總計**4億8,632萬元**

一、經費來源：本市丹娜絲颱風災害捐款(募款總額**2億4,634萬8,475元**)、賑災基金會善款

二、用途：

1. 車輛泡水或受外力毀損慰助：匡列8,632萬元
2. 家園復原慰助：匡列3.5億元
3. 住戶淹水慰助：匡列5,000萬元

為維護**弱勢戶居住安全**，「**一戶一社工**」協助低收/中低收入戶、獨居老人、身障、脆弱家庭等，媒合慈善團體安心家園計畫，培力弱勢戶朝向穩定生活與自立發展，共計**服務18,849人次**。

捐贈物資：計媒合34家民間團體及29位民眾捐物予災民及弱勢戶。

動員志工團體，協助弱勢戶家園清理等，**動員志工計21,911人次**。

車輛泡水或外力毀損慰助

NO	行政區	複審案件數	NO	行政區	複審案件數	NO	行政區	複審案件數
1	北門區	490	13	六甲區	125	25	北區	106
2	後壁區	642	14	新市區	75	26	安平區	66
3	學甲區	764	15	麻豆區	440	27	南區	52
4	七股區	620	16	歸仁區	10	28	玉井區	3
5	將軍區	507	17	西港區	247	29	楠西區	1
6	鹽水區	940	18	下營區	486	30	南化區	1
7	佳里區	588	19	善化區	98	31	仁德區	14
8	柳營區	274	20	安定區	133	32	左鎮區	1
9	白河區	274	21	官田區	62	33	永康區	360
10	新營區	172	22	新化區	17	34	東區	116
11	東山區	166	23	大內區	4	35	中西區	117
12	安南區	452	24	山上區	2			

合計8,425件

➤ 申請時間：114年7月11日至8月29日止

➤ 發放標準及金額：

汽車(含大型重機)
上限1萬元

機車(含微電車)
上限2千元

倘汽、機車修理或減損金額，未超過補助額度上限，
將以實際修理或減損金額補助

➤ 辦理流程：各區公所受理案件後進行初審，
每週彙整提送交通局複審及撥款

➤ 辦理進度：各區公所合計受理10,456件，
提送交通局複審8,425件，交通局迄今複審
完成6,415件(汽車5,279件、機車1,093件、
重機33件、微電車10件)，累計撥款5,129
萬6,504元

統計至114.9.30

➤ 送中央審核案件共計12,515件，已核定11,146件，核定金額逾8.48億元

臺南市丹娜絲颱風農損受理送件及核定金額統計表														金額(千元)		
農糧				漁業			畜產業			漁船(筏)			合計			
日期	受理件數			受理件數			受理件數			受理件數			受理件數			
9/26	19,063件			2,347件			627件			284件			22,321件			
	送農 業部	核定 件數	核定 金額	送農 業部	核定 件數	核定 金額	送農 業部	核定 件數	核定 金額	送農 業部	核定 件數	核定 金額	送農 業部	核定 件數	核定 金額	
	10,688	9,742	334,287	1,328	1,133	509,769	230	2	187	269	269	4,082	12,515	11,146	848,327	

統計至114.9.26 16時

中小企業災後協助

➤ 啟動臺南市中小企業服務團協助，降低中小企業造成的衝擊

復舊復工貸款

- 中央機關：經濟部中小及新創企業署
- 額度：金融機構視個案評估
- 利率：最高2.22%
- 保證成數：超過100萬元一律9.5成，100萬元以內一律10成
- 申請期限：114年7月5日至115年2月12日
- 中小企業災害復舊貸款**25件**，融資金額**1億8,525萬元**
- 企業小頭家貸款**2件**，融資金額**200萬元**

臺南市中小企業服務團

- 設有溪北、溪南諮詢窗口
- **電話關懷224家，現場訪視11家**



政策諮詢、轉型輔導、協助補助申請等
一站式服務，協助業者緩解
「災後復原」與「關稅挑戰」雙重壓力

利息補貼

- 中央機關：經濟部中小及新創企業署
- 復工貸款利息補貼，最高50萬元；舊有貸款利息減免，最高40萬元
- 利率：最高2.22%
- 補貼期限：最長1年
- 申請期限：114年7月5日至115年2月12日
- 復工貸款利息補貼**6筆**，核准貸款金額**5,720萬元**
- 舊有貸款利息減免**2筆**，核准貸款金額**4,582萬元**

受災店家與攤(鋪)商援助

- 照顧小店家、攤商，**率全國之先**8月11日，展開收件審核，從寬、從速、從簡辦理，**同時成立諮詢專線及網站專區**

製造業設備及設施復原補助

- ❖ 對象：位於行政院公告災區製造業業者（含納管工廠）
- ❖ 範疇：機械設備修復、調校；生產場域設施修繕（如鐵捲門及鐵皮屋頂修理）
- ❖ 內容：每家最高20萬元
- ❖ 申請期限：至114年10月31日止或經費用罄為止
- ❖ 現況：本市申請182件，134件通過、7件不通過、41件補件中，補助金額約2,358萬元

石棉瓦清運

- ❖ 對象：臺南市、嘉義縣市製造業者
- ❖ 範疇：廢棄石棉瓦
- ❖ 內容：業者拆除及裝袋後，由環境部委外開口契約廠商清運
- ❖ 申請方式：上網申請
- ❖ 現況：18家業者申請，完成打包13家，合計打包298袋，環境部陸續請清運業者清運

店家、攤(鋪)商援助



率先

- ❖ 對象：公告災區具稅籍登記之營利事業受災商業店家、地方政府列管之傳統市場及夜市攤(鋪)位使用人
- ❖ 項目：招牌、鐵捲門、展示架等生財器具毀損
- ❖ 內容：每家1萬元
- ❖ 申請期限：自114年8月18日起至114年12月31日
- ❖ 現況：店家受理1,857件，審核1,273件，核准通過773件；攤(鋪)商受理146件，審核146件，核准通過145件

商家設備汰換補助

- ❖ 對象：公告災區具稅籍登記之營利事業受災商業店家、地方政府列管之傳統市場及夜市攤(鋪)位使用人
- ❖ 項目：汰換購置能源效率分級標示為一級之空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃(箱)及空氣源式熱泵熱水器
- ❖ 內容：購置金額50%，最高5萬元
- ❖ 申請期限：自114年7月5日起至114年12月31日，或經費用罄為止

政府媒合修繕成果

統計至114.9.26

- 受災面積**20m²以上**民宅，登記媒合**3,637戶**，已100%完成現勘；**不需媒合為2,626戶，已簽約1,003戶**。
- **弱勢358戶**，列入重點協助。政府全額補助，目前已**234戶完成修繕**，**40戶施工中**。
- 提供『**丹娜絲颱風受損房屋媒合修繕意願調查表**』尊重民眾復原意願避免媒合資源空轉，加速復原作業進行。



9/26	區別	登記申請		媒合安排		不需媒合	完成簽約		施工中		完成	
		總數	弱勢	總數	弱勢		總數	弱勢	總數	弱勢	總數	弱勢
1	新營區	618	41	618	41	484	134	39	19	6	115	33
2	鹽水區	489	19	489	19	374	114	16	2	0	112	16
3	白河區	160	6	160	6	131	29	6	6	0	23	6
4	柳營區	238	56	238	56	124	114	33	0	0	114	33
5	後壁區	226	33	226	33	183	43	15	3	0	40	15
6	東山區	69	3	69	3	52	17	3	0	0	17	3
7	麻豆區	72	20	72	20	41	31	19	0	0	31	19
8	下營區	115	28	115	28	35	80	28	14	7	64	21
9	六甲區	89	18	89	18	47	42	16	7	0	35	16
10	官田區	13	6	13	6	6	7	6	0	0	7	6
11	佳里區	388	25	388	25	314	71	14	9	1	54	12
12	學甲區	258	23	258	23	186	70	23	40	15	30	8
13	西港區	35	8	35	8	22	13	8	6	5	7	3
14	七股區	466	21	466	21	345	119	21	21	1	68	15
		3	3	3	3	0	3	3	0	0	3	3
15	將軍區	207	27	207	27	143	64	27	9	3	29	6
16	北門區	110	18	110	18	82	28	18	3	2	25	16
17	安南區	81	3	81	3	57	24	3	1	0	23	3
合計		3637	358	3637	358	2626	1003	298	140	40	797	234

丹娜絲雲嘉南災後復原前進指揮所 20m²以上媒合施工管控表

拆除屋損嚴重災屋

- 行政院雲嘉南災後復原前進指揮所8/5宣布，**災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前**委由政府代拆，費用政府吸收，可洽公所登記；**自行雇工拆除補助2萬元。延長至10月底。**
- 114.8.12公告「臺南市政府辦理補助丹娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫」。
- 部分**老舊房屋結構脆弱**、強風過後、**梁柱牆面受損嚴重**，不堪居住、**復原經費龐大**等。
- 登記委託拆除有**293件**，申請自拆**240件**，已完成**161件**。委拆案件經區公所**審核，符合拆除計畫規定**，即依續辦理拆除，加速協助民眾進行災後整理。
- 114.9.8公告「臺南市丹娜絲風災災區**傾頹或朽壞建築物拆除**作業實施計畫」，由各區公所於轄區內進行查報，本府工務局列管及進行後續拆除相關作業。




114.08.22六甲區鄭姓民眾老家首例政府代拆



市容景觀復原大型垃圾清運

環保局每日調派各區清潔隊投入市容復原工作，清除道路樹枝、落葉及大型垃圾等，截至9/29(一)共出動23,090人次、機具5,919輛次，約已清理43,700公噸垃圾，約1年7個月巨大垃圾量。

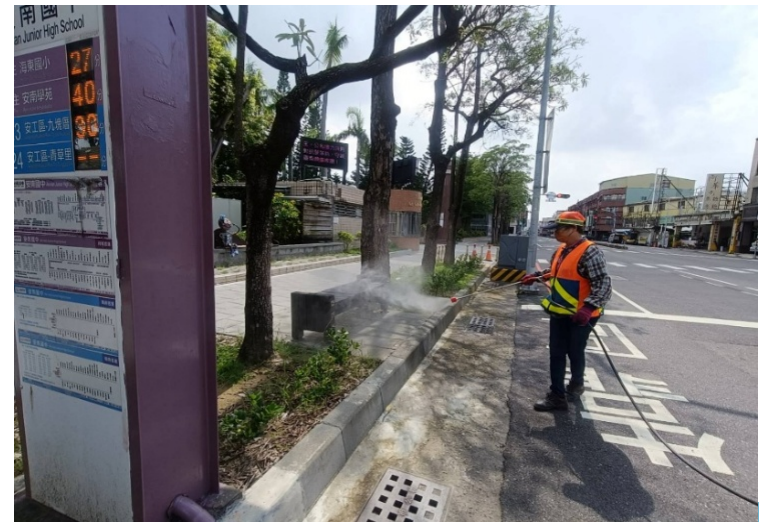

加速石綿廢棄物清理

滾動檢討清運模式，加速石綿清理進度

按民眾登記名單清運模式

按登記地址清運，因屋頂多數尚未拆除，清運效果有限

里長帶路清模式


里長主動協助，提升清運效率

每日每區逐里清運模式

增派車輛人力，17區計285里9/1完成至少1輪

按需求清運模式

因後續修繕、拆除仍會有石綿排出，由里長協助收集名單，再安排清運

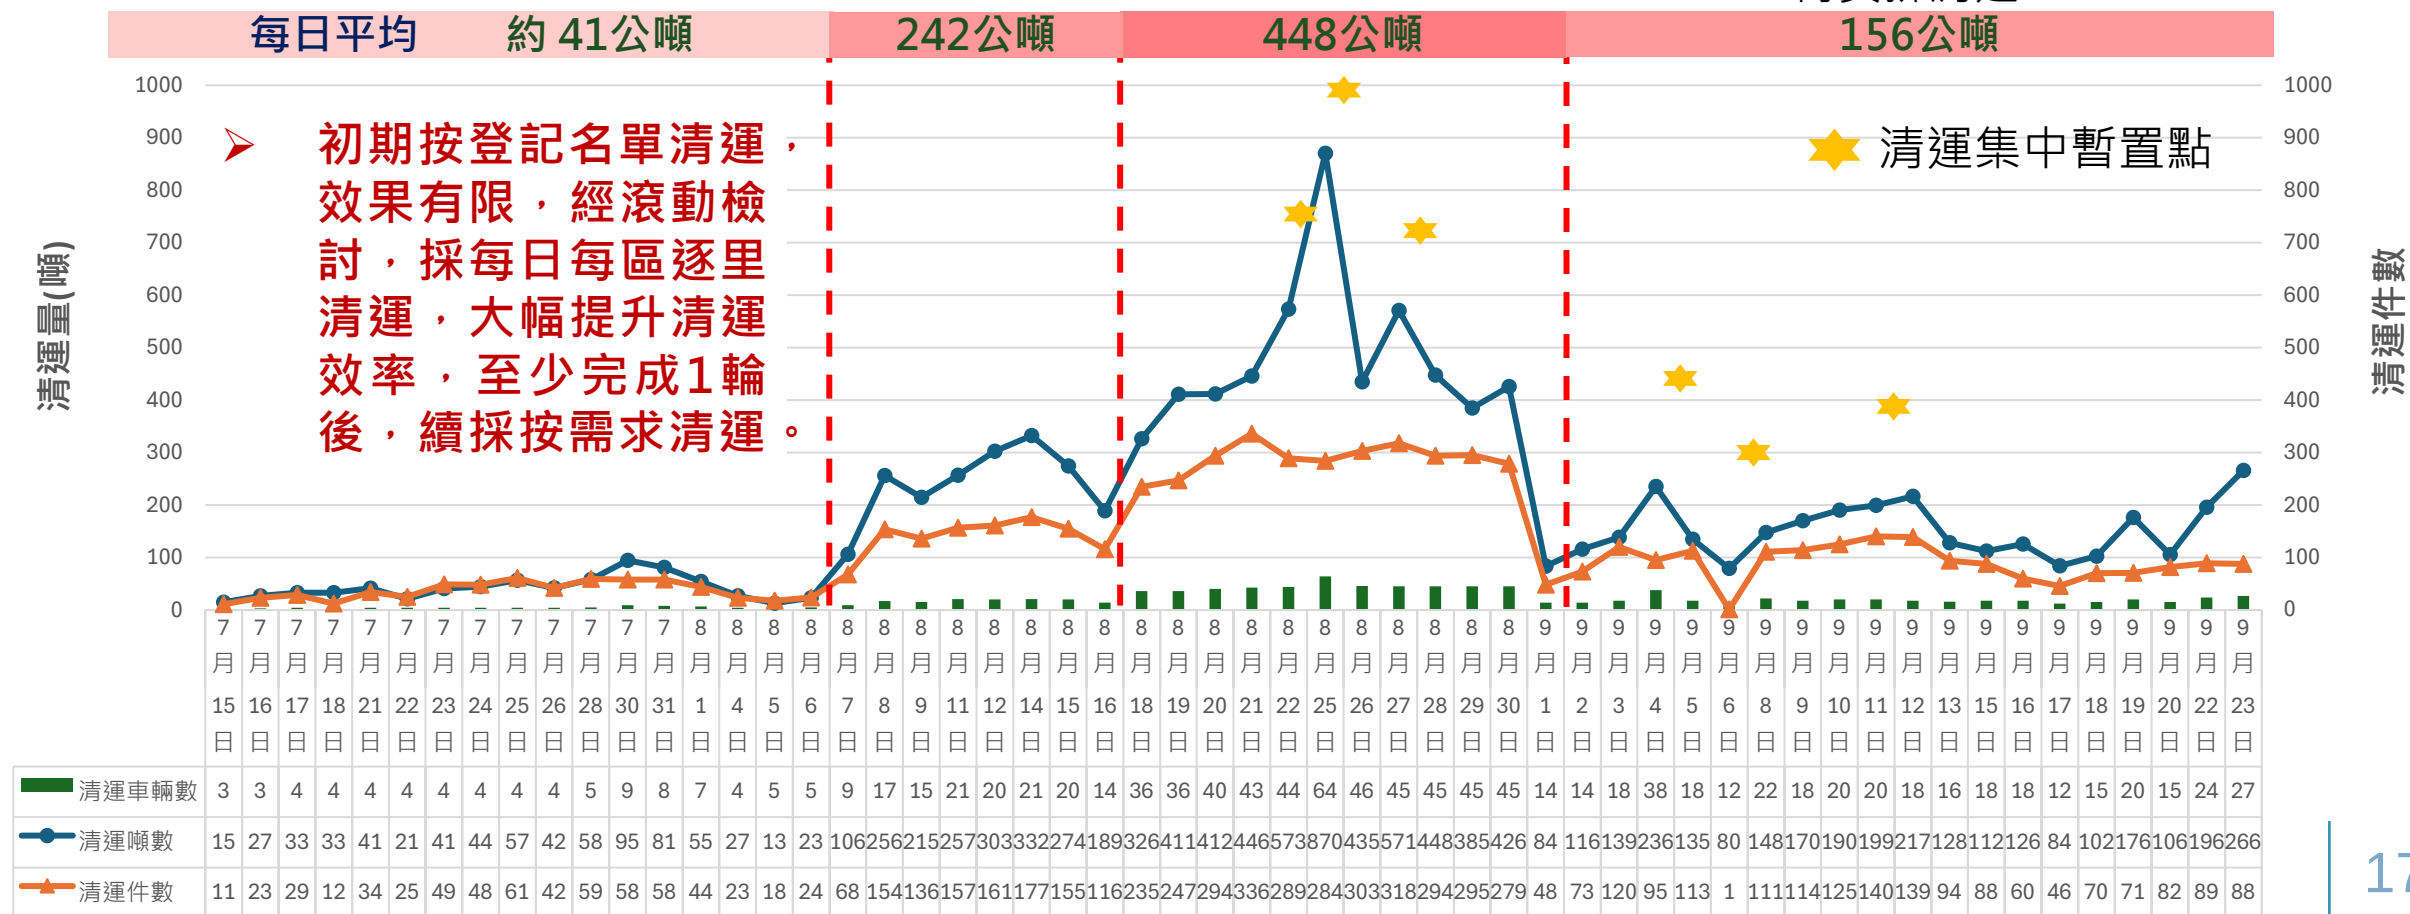

農漁業設施、製造業(工廠)石綿清運

- 農業局審認風災之農漁業設施，已清運55處約414.54噸
- 製造業18處則由環境部安排清運，已清運2處23.49噸

畜牧場



農業局審認553處 / 可清運216處

已清運38處
(完成約18%)已清運
389.85噸

漁業設施



農業局審認25處 / 可清運21處

已清運17處
(完成約81%)已清運
24.69噸

製造業



經濟部通報18處

由環境部安排清運
已清運2處23.49噸

※農漁業設施屬事業單位且單點大量，規劃由石綿處理廠商（全台僅3家）
直接載運回處理廠固化掩埋處理。

清理超過**1.1萬噸** 達全年清運量**4.8倍**，預估清理**2萬噸**
向環境部爭取**10.1億元**(已核**5.05億元**)

- 受理9,843件
- 已清運11,416公噸
- 已出動2,128人次，1,378輛次抓斗車、鏟裝機及卡車等
- 已配送16,745只太空包

Category	臺南市 (Taian City)	嘉義縣 (Jiayi County)	嘉義市 (Jiayi City)
受理件數 (Number of cases accepted)	9,786	4,637	833
清運噸數 (Number of cases cleared)	10,949	2,090	619

統計至114.9.29

- 建置石綿瓦地圖
- 試作石綿撿拾清理
- 啟動小蜜蜂巡查作業



試作檢拾清
理

災後廢棄物後續去化規劃經費

廢棄去化經費累計向中央爭取約9.39億元，已核定約3.07億元

堆置場域 名稱	廢棄物 種類	堆置量體 (公噸)	爭取經費	後續去化規劃
城西 掩埋場	綜合類	27,691	4.98727億元 (已核1.5億元)	可分為資源回收(廢鐵)變賣 入庫；可燃之木(板)材，載 運至再利用機構，續提供最 終燃料業者；不可燃廢棄物 將轉運掩埋場掩埋。
後壁 烏樹林 (堆置量以車次 推估) 預計於115年7 月完成清理	綜合類	51,968		
	磚瓦	81,940	1.57281億元 (已核1.57281億元)	B5類作為回填料使用(如混 凝土粒料、填料、鋪面材料 等)
	樹枝	30,240	0.84億元	載運至再利用機構，續提供 最終燃料業者。
北門 掩埋場	樹枝	11,966		

項目	爭取經費
清潔人力 及機具租 賃	0.66億元
機具維修 及保養	0.25億元
清除轉運	0.88294億元
處理設施 復建工程	0.2億元

統計至114.9.29

溫網室等農業設施等清理及復原

- 農業局輔導農民申請**溫網室設施重建及修繕**，**已完成44件**，持續進行中，並彙整29家搭設溫網室設施業者名單及20家具有附加吊桿車輛清除機構名單供有需求農民參考媒合。
- 農業局結合農會協助農民處理農業廢棄物清運至環保局暫置點，**已處理649公噸廢棄農膜、防蟲網、植株介質、保麗龍槽等**，加速農民復建復耕。

類別	清運/復原數量	處理方式	進度
溫網室重建及修繕	44件	提供農糧署彙整 29家 搭設溫網室設施業者名單	持續進行中
溫網室農膜廢棄物 地膜、棚網、防蟲網	432公噸	農會僱工、機具運至北門清潔隊暫置點 車次：72趟	持續進行中
火鶴花廢棄物 黑網、植株介質、保麗龍植槽	217公噸	由協會僱工運至北門(黑網)及城西(植株介質、保麗龍植槽)掩埋/焚化場 車次：52趟	持續進行中

災後受損光電板清理進度


受損光電板及浮筒完成拆除清理

大型案場 (15場)

- 受損模組已有15家業者13,929片已完成拆除清運至處理廠
- 受損浮筒共計4.68噸已完成清理
- 農業局列管受損漁電共生案場12家已全部清理完成

小型案場 (8場)

- 1,333片皆已完成拆除
- 受損模組已有5家業者完成清運至處理廠，共計1,206片；另受損浮筒皆已完成清理，共計8.75噸
- 3家業者拆除之127片模組均妥善暫置於倉庫內

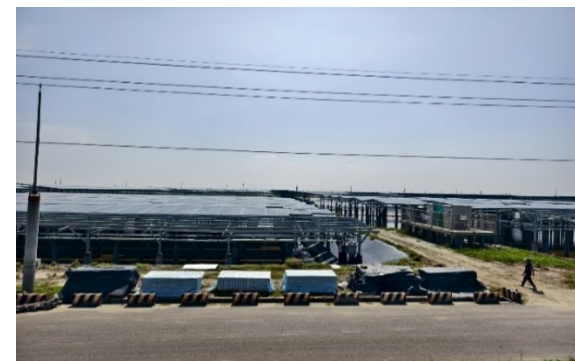

文化資產災損57處

國定古蹟：1處


市定古蹟：34處

歷史建築：21處

聚落建築群：1處

➤ 受損多集中於屋面瓦作、門窗、剪粘等裝飾性灰作，不影響基本功能與結構安全。

➤ 國定古蹟南門段殘蹟則是受0728豪雨沖刷災損，目前已完成城垣崁腳加固。

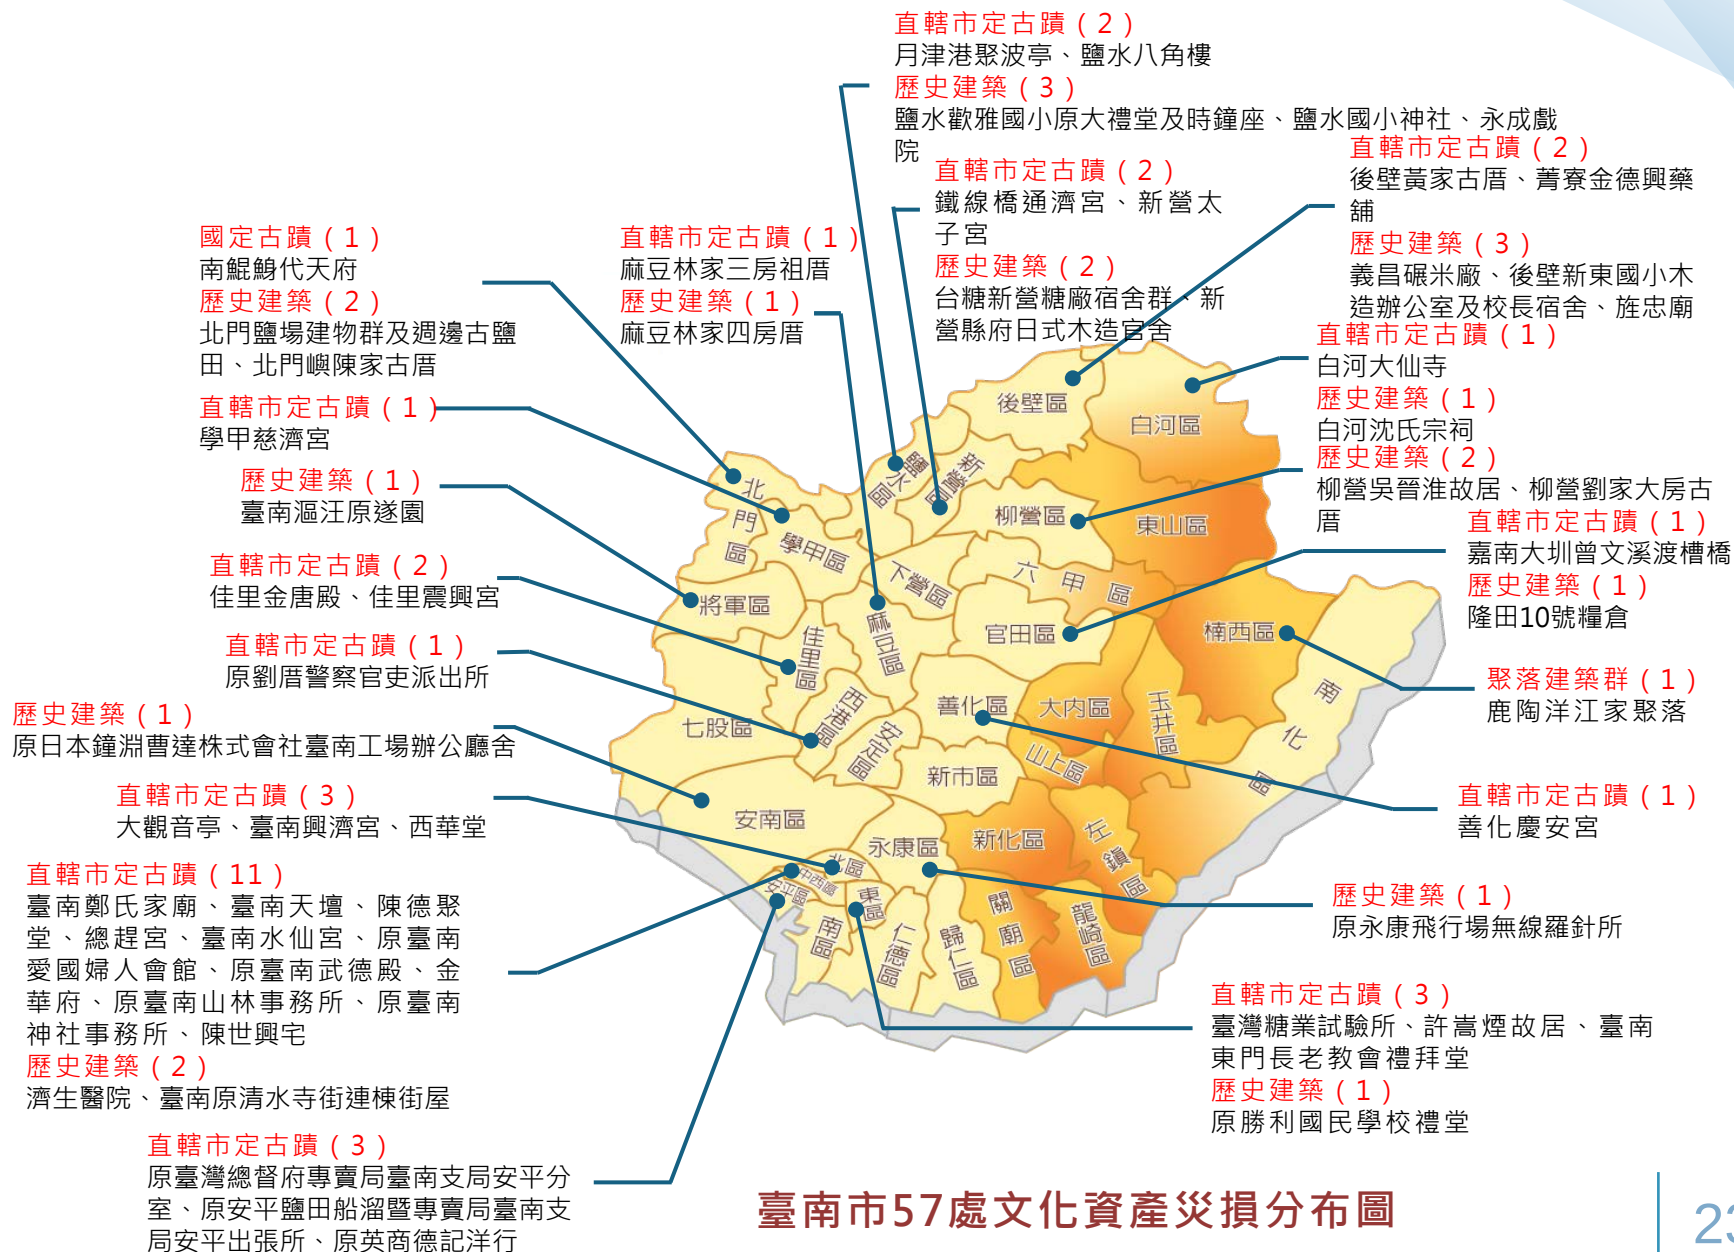

文化資產災損修復進度

- 優先爭取本府災害準備金約 1,000萬，加速災後復建作業流程。
- 修復經費達150萬元以上，同步向中央文化資產局申請補助。
- 爭取特別條例經費挹注約2.3億元。

4

情況較嚴重(損壞規模大)

目前均進行損壞調查設計中
南鯤鯓代天府、北門鹽場建
物群及週邊古鹽田、北門嶼
陳家古厝、鹽水八角樓

44

情況較單純未涉結構安全

已完成12處
修復中29處
待經費核定3處

9

情況輕微未影響使用

丹娜絲颱風緊急處置- 護岸加高及建立三道防線

- 為七股區西寮聚落防汛安全，緊急加高防洪牆全長1,000公尺、高度60公分，工程於7月17日完成。

第一道防線

於海巡署的西寮執檢站附近搭建鋼便橋，完成大寮排水破堤緊急搶修。

第二道防線

7月28日完成鹽田土堤加高加固，修復完成後成功積蓄鹽田水量，阻止外水倒灌。

第三道防線

7月25日完成市道176線路堤加高作業，避免海水倒灌進入社區。



第1道防線搶修完成



第2道防線土堤加高完成



第3道防線路堤加高完成

積極爭取經費強化防洪

向中央應爭取47.33億元，已獲經濟部核列4.03億元

- 丹娜絲風災市府提出七股沙洲復育計畫、大寮排水防潮閘門及蓄洪池治理、西寮等社區抽水設備及水路系統改善、大寮排水系統護岸加固整治等，預期將防洪能力全面提升，提報總經費**17.6億元**。
- 因應0728大豪雨超出設計強度之雨量，後壁地區排水系統整治部分，首要改善分為**聚落內水分流改善**及**菁寮排水整治**二大部份，包括**菁寮社區內水排水路分流**、菁寮排水從新嘉橋延伸整治至菁寮社區菁長橋，包括**4公里河道整治**、**3座橋梁改建**及用地費，總經費約需**17.5億元**。
- 因應0728大豪雨後續在六塊寮排水系統整治部分，辦理**新順橋改建**、**增設抽水站**，**滯洪池**，**改建左岸護岸及堤後排水**，總經費約需**8.2億元**。
- 經濟部已核列**2.3億元**辦理**下洲子抽水站二期新建工程**，將會增加9CMS抽水量，及新設排水箱涵；**1.73億元**設置**新吉分洪箱涵工程**，最大分洪量達9CMS。



緊急搶救

- 114年度災準金編列**17億元**，其中0121楠西地震及搶險搶修開口契約等已動支約**11.49億元**，另丹娜絲颱風及0728豪雨災害「緊急搶救」及「法定天然災害救助」已動支約**14.48億元**，合計動支約**25.97億元**，其中不足約**8.97億元**部分本府已依據「各機關單位預算執行要點」**第44條第3款**及**第45條第1款**墊付款支用相關規定辦理墊付完成，並已函文貴會。

災害復建工程

- 本次114年丹娜絲颱風及0728豪雨，臺南市已向中央提報**283件**，金額約**12.27億元**，其災害復建工程經費**中央會依審核結果全額補助**。



丹娜絲颱風鹽水區岸內排水番寮橋下游350公尺處右岸護岸災後復建工程，提報1200萬元



丹娜絲颱風龍崎區楠坑里樹子林野溪災後復建工程，提報1800萬元

災害復建工程

➤ 114年丹娜絲颱風及0728豪雨災後復建工程，依據不同的**災害類別**，復建工程共計**283件**，金額約**12.27億元**，已向中央提報爭取經費補助

機關別	災害類別	複勘後評定災害層級									
		A		B		C		D		合計	
		件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額
水利局	水利工程A1	31	335,095	2	9,836					33	344,931
	水土保持工程G1	7	31,770	13	63,914					20	95,684
工務局	公路系統工程C1	22	104,264							22	104,264
	市區里道路橋梁工程C2	6	17,099							6	17,099
	建築工程(公園)D1	6	16,185							6	16,185
農業局	農路工程H3	25	88,463	69	150,918	0	0			94	239,381
	建築工程D1	0	0	1	3,200	0	0			1	3,200
教育局	學校工程L1	20	58,591	7	26,527					27	85,118
漁港及近海管理所	漁港工程K1	4	92,515							4	92,515
地政局	農地重劃區農水路工程H1	2	17,270	3	10,035					5	27,305
觀光旅遊局	觀光工程 B 1			9	43,465					9	43,465
環境保護局	環保工程M1	3	8,000							3	8,000
體育局	學校工程L1			16	83,437					16	83,437
民政局	活動中心D1	2	5,120	3	7,021	4	3,277			9	15,418
文化局	圖書館辦公室建築工程D1					3	19,238			3	19,238
	文化資產工程P1					1	1,087			1	1,087
文資處	文化資產工程P1			3	1,098	1	2,000			4	3,098
	建築工程D1	2	746							2	746
社會局	社區活動中心D1	2	12,565							2	12,565
	公設民營老人福利機構D1			1	1,150					1	1,150
	社會福利服務中心D1							1	250	1	250
警察局	建築工程D1	12	7,801							12	7,801
	文化資產工程P1	1	2,500							1	2,500
都市發展局	文化園區D1	1	2,653							1	2,653
層級依序累計		146	800,637	127	400,601	9	25,602	1	250	283	1,227,090

爭取預算 全力復原

- 「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，係為加速推動復原重建，業經114年8月19日總統令公布，特別預算於8月29日經立法院三讀通過，預算規模新台幣600億元。
- 本府農業局、水利局、工務局、經發局、環保局、交通局、社會局、文化局、消防局等提報計畫，截至9月23日爭取**261億9,230萬元**。以及本府災防辦向中央爭取丹娜絲颱風專案提報復原緊急搶救經費及復建工程費用共**24億元8,463.6萬元**，總計爭取**286億7,693.6萬元**。
(截至9月23日環保局獲核定8.12億元、工務局獲核定11.99億元)

爭取本市重要電力幹線地下化工程

提升整體防災效能，確保供電穩定

- 經與台電共同討論，針對本市轄內天然災害常造成配電事故區段、海岸迎風面及影響停電範圍大之配電幹線，且路基良好，無地層下陷區域之路段，納入韌性電網計畫評估
- 經發局於114年9月2日函請台電向經濟部爭取25億7,040萬元預算，並納入《丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例》預算，執行安南、南區、北門、鹽水及學甲、關廟、南化、將軍、善化等行政區之電力幹線地下化工程，提升整體防災效能，降低災害對配電設備線路之損害，確保供電穩定

項次	行政區	工程路段	路段長度 (公尺)	工程經費 (萬元)
1	安南區	台17線164K~168K(國聖橋南側~北汕尾三路)	4,000	16,800
2	南區	台17線180k+300m~181k+300m(鯤鯓路~喜明街)	1,000	4,200
3	北門區	台17線137K+700~147K+700	20,000	54,150
4	鹽水、 學甲區	台19線100K+0~118K+500	37,000	143,250
5	關廟區	台19甲線51K+500~52K+600(保安橋~長文街)	1,100	4,620
6	南化區	台20乙線6K~7K(南化市區)	1,000	4,200
7	將軍區	南21線(南20~南18，漚汪木棉花道)	1,500	6,300
8	善化區	台1線312K+700~318k+300(178線~西拉雅大道)	5,600	23,520

預計爭取經費：25億7,040萬元

爭取預算 全力復原

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案爭取經費彙整表

重建項目	本府局處 /中央對應部會	總申請經費 (億元)	申請計畫
農業設施	農業局 /農業部	5.98	農糧、漁業、畜牧業專案補助輔導措施
電力設施	工務局/經濟部 經發局/能源局	26.701	1.區路轄燈、景觀燈設施設備修復及改善工程 2.爭取本市重要電力幹線地下化工程
自來水、天然瓦斯及燃料設施	經發局/經濟部	0.629	辦理災區原水取水、淨水場、加壓站、其他供水設施之損毀修復及災後環境復原計畫
家園及公共設施	工務局/國土署	21.81	1.淹水區域側溝改善計畫(13區) 2.住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫、家園復原慰助金、災後危樓拆除等
	水利局/國土署	49.1	復原重建下水道計畫

爭取預算 全力復原

重建項目	本府局處 /中央對應部會	總申請經費 (億元)	申請計畫
家園及公共設施	觀旅局/觀光署	1.24	文化觀光旅遊振興提案計畫
	環保局/國土署	6.5601	1.建築物拆除營建混合廢棄物清運及處理計畫 2.磚瓦土石清運計畫
	文化局/文資處	1.7061	有形文化資產災損案件補助計畫
水利設施	工務局/水利署	18.739	新營區延平路與柳營區柳營路跨急水溪橋改建工程等7件
	水利局/水利署	107.13	1.復原重建水利建設計畫 2.復原重建清淤及逕流分攤計畫
道路交通	交通局/公路局	0.2	台南市境內交通設施(號誌、標誌)搶修及韌性強化工程
	工務局/公路局	3.322	市道、區道搶修建計畫-道路邊坡防護案6件及道路排水案-14件

爭取預算 全力復原

重建項目	本府局處 /中央對應部會	總申請經費 (億元)	申請計畫
環境衛生復原	環保局/環境管理署/資源循環署	12.9329	1.石綿瓦建材廢棄物清理補助計畫 2.颱風災後樹枝及家具處理計畫 3.掩埋場災後廢棄物轉運計畫 4.機具維修及保養修正計畫 5.一般廢棄物集中點去化清除計畫 6.災後復原清潔人力、機具租賃修正計畫
社會復原及產業促進	社會局/水利署	0.19	淹水補助
	農業局/農業部	2.06	爭取22家農會修繕補助經費
預備金	工務局/內政部	2.374	公園(綠地)設施修復、改善及綠美化工程
	消防局/消防署	1.25	臺南市防救災韌性治理資訊整合平臺建置計畫
總計		261.923	

攜手重建、共度難關

結語

- 丹娜絲颱風、0728大豪雨重創台南，對農業、道路、住宅及基礎設施造成嚴重損害。面對災情，市府各局處通力合作，第一時間啟動緊急應變機制，並在市議會各位議員、民間團體、企業及中央政府的支援下，逐步完成災後復原與重建工作。
- 本次災害也展現出社會的凝聚力與韌性：各縣市互助、企業捐資捐物、公益修繕、中央與地方攜手合作，讓救災及補助措施能快速到位。雖然過程艱辛，但也再次驗證「政府—民間—社區」三方合作的重要性。
- 展望未來，市府將以此次經驗為借鏡，強化防災基礎建設、推動更精準的災情通報系統，並完善受災補助與心理支持機制，期望再次面臨天災時，能更快回應、更有效復原。丹娜絲颱風留下的傷痕，也將成為台南邁向更安全、更具韌性的契機。
