

玉井區豐里里厝尾部落(內豐高分39右11右3電桿旁)道路側溝改

善工程會勘紀錄

一、會議時間：101年03月22日上午10時整

二、地點：現場

三、出席單位人員：

王峻潭議員服務處：王江賢主任

玉井區公所：岩柏安

台南市政府工務局公共工程處：陳芳湖

里長及地方人士：賴吉榮里長

四、結論：本案經會同王峻潭議員服務處、玉井區公所及里長等會勘，

該豐里里厝尾部落，該段道路側溝原為砌卵石溝，因年久失修都已崩

落堵塞喪失排水功能，故社區遇雨成災(如相片)，故擬施設排水溝：

長250 道路AC路面250 m*4 m

本案經費約：排水溝：250*7,900=1,975,000 元

AC路面 1,000*350=350,000 元

合計 2,325,000 元

玉井區中正里中興社區道路側溝排水改善工程會勘紀錄

一、會議時間：100 年 6 月 15 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地 點：現場


三、出席單位人員：

王峻潭議員服務處：王江賢主任

玉井區公所：岩柏安

台南市政府工務局公共工程處：陳芳湖

里長及地方人士：鄭錦堂（里長）

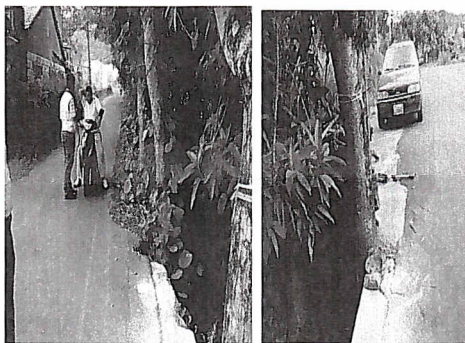

此段排水溝前段已改為箱涵。

四、結論：本案經會同王峻潭議員服務處、里長、玉井區公所等會勘，該道路側溝前段已改善為箱涵，後段約 100m 現為砌卵石因年久失修已部分崩壞，又該路段因路面狹窄會車不易，故該側溝擬改善為箱涵。

本案經費約：排水箱涵（2m*1.5m）長 100m

$100 \times 14200 = 1,420,000$ 元

「玉井區玉田里長興橋面及上游水溝改善工程」

現勘紀錄

一、時 間：100 年 03 月 18 日上午 10 時

二、地 點：現地

三、出席單位及人員：

王峻潭議員：王江賢主任

台南市政府工務局：陳景明

玉井區公所：岩梅 郭嘉林

地方人士：

四、決議事項：

1. 玉田里長興橋及上游水溝改善工程，長興橋現橋寬約 4 公尺較兩側路面窄小，且其橋下斷面亦比上下游斷面窄小，故擬將該橋改建為長 6 公尺及寬 6 公尺橋樑，其上游排水溝亦剩約 15 公尺尚未改善，擬一併改善。

本案經費約：橋樑 $6\text{m} \times 6\text{m} \times 28000 = 1,008,000$ 元

上游排水 $15\text{m} \times 20000 = 300,000$ 元

合計所須經費 1,308,000 元
