

## 交通部觀光署 函

地址：106433 臺北市忠孝東路4段290號9樓

聯絡人：許銘仁

聯絡電話：02-23491500 分機：8316

傳真：02-27316814

電子郵件：ak6924@tad.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年7月16日

發文字號：觀景字第11340012901號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：本案行動計畫項目及經費一覽表 (A15010000H\_11340012901\_doc3\_Attach1.pdf)

主旨：貴府函送之「重要廊帶亮點營造計畫」-「水映南瀛」修正計畫書，請依說明辦理，復請查照。

說明：

- 一、依本署113年6月14日觀景字第1134001078號開會通知單及貴府113年6月7日府觀技字第1130812481號函續辦。
- 二、貴府所提旨案修正計畫書，經本署召會審議有條件通過(請依附件辦理)，同意依貴府所提核定計畫總經費新臺幣4億9,250萬元整，由本署補助新臺幣2億9,995萬元執行。
- 三、請依本署113年7月3日召開專家顧問委員會現地勘查暨督導會議結果，依各委員及本署綜合意見修正，113年7月22日前函送計畫書定稿本(請將本函納入計畫書)5本(含電子檔)過署。
- 四、本案應自計畫核定之日起至116年底前執行完畢，請依「重要廊帶亮點營造計畫執行注意事項」(詳「重要廊帶亮點營造計畫」附錄7，本署113年1月15日觀景字第1124002537

號函諒達) 辦理後續相關事宜，並儘速檢具納入預算證明或墊付款核定通知(議會同意墊付函)、請款明細彙整表、月進度管制表、領款收據等文件至署，請領第一期補助款。

五、核定計畫各項里程碑達成期限原則如次，請依期程辦理，以避免補助經費流失：

- (一)計畫核定後，檢具納入預算證明或墊付款核定通知(議會同意墊付函)等函送本署請領第1期款(20%)。
- (二)113年12月底前，完成各行動計畫發生權責，檢具契約副本(或相關佐證資料)等函送本署請領第2期款(10%)。
- (三)114年12月底前，行動計畫所屬工作項目下各標案累計進度達55%以上者，檢具足資證明進度文件等函送本署請領第3期款(35%)。
- (四)115年12月底前，行動計畫所屬工作項目下各標案累計進度達70%以上者，檢具足資證明進度文件等函送本署請領第4期款(30%)。
- (五)116年12月底前，行動計畫所屬工作項目達100%以上者，檢具工作成果報告書或工程決算書等，函送本署請領剩餘款，核算方式以本署補助款決算金額，扣減已請領補助款。

六、另為期本計畫進度之推動及成效之落實，有關各相關行動計畫注意事項如下：

- (一)涉及硬體工程部分，請貴府於工程上網招標前，先將相關設計書圖及預算書圖資料送本署審查，並俟核定後再行辦理後續招標事宜，另請預留本署審查期程。

(二)依「交通部所屬公共工程經費審議機制作業規定」，中央補助直轄市及縣(市)辦理之公共工程計畫內個案工程，補助比率逾百分之五十且補助經費達新臺幣1億元以上者，依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」各款規定辦理基本設計審議；另5,000萬元以上應送本署辦理基本設計審查。

(三)軟體行動計畫請於招標作業前提出詳細執行內容及作業期程報署備查後辦理。

正本：臺南市政府

副本：電  
交  
2024/07/16  
11:18:40  
子  
公  
文  
章  
換  
章



# 重要廊帶亮點營造計畫 水映南瀛

申請單位：臺南市政府觀光旅遊局  
補助單位：交通部觀光署


113 年 7 月 29 日

## 總說明

- 一、交通部觀光署透過競爭型計畫協助地方政府發揮創意、善用在地優勢特色資源，整備相關軟硬體設施以發展重點亮點遊憩廊帶，此為競爭型補助計畫，計畫期程為 113 至 116 年。
- 二、本府「水映南瀛」計畫以埤塘觀光為策略，盤點埤塘、聚落及博物館等三個方向資源發想整體空間規劃。未來將結合埤塘水景、小鎮聚落與在地博物館，定位出在地發展遊憩特色與遊程，再藉由鐵路與綠色運具串聯形成縱向休憩廊帶，並東西兩側橫向聯結雲嘉南濱海國家風景區、台江國家公園及西拉雅國家風景區，提升臺南區域觀光產業發展，吸引國內與國際旅客的目光。
- 三、本計畫總經費共計新臺幣 4.925 億元整：
  - (一)硬體計畫共 3 項，「德元埤荷蘭地景營造計畫」、「葫蘆埤濕地休憩園區營造計畫」、「虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫」，合計新臺幣 3.8 億元整。
  - (二)軟體計畫共 7 項，「永續旅遊目的地推廣計畫」、「埤塘露營地及水域休憩品牌營造」、「臺南旅宿市場及產業輔導升級」、「埤塘低碳電動遊園輔導計畫」、「埤塘觀光集客體驗活動計畫」、「埤塘觀光遊程及導覽建置計畫」、「工程專案管理及工作執行推廣計畫」，合計新臺幣 1.125 億元整。
- 四、為符合期限，實有儘速提送墊付案審議之需，以達成中央規定辦理期程。

軟硬體分項計畫經費總表

| 項次 | 硬體計畫名稱           | 經費(萬元) |
|----|------------------|--------|
| 一  | 德元埤荷蘭地景營造計畫      | 9,000  |
| 二  | 葫蘆埤濕地休憩園區營造計畫    | 7,000  |
| 三  | 虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫 | 22,000 |
| 小計 |                  | 38,000 |
|    | 軟體計畫名稱           |        |
| 1  | 永續旅遊目的地推廣計畫      | 700    |
| 2  | 埤塘露營地及水域休憩品牌營造   | 2,500  |
| 3  | 臺南旅宿市場及產業輔導升級    | 1,800  |
| 4  | 埤塘低碳電動遊園輔導計畫     | 950    |
| 5  | 埤塘觀光集客體驗活動計畫     | 3,000  |
| 6  | 埤塘觀光遊程及導覽建置計畫    | 800    |
| 7  | 工程專案管理及工作執行推廣計畫  | 1,500  |
| 小計 |                  | 11,250 |

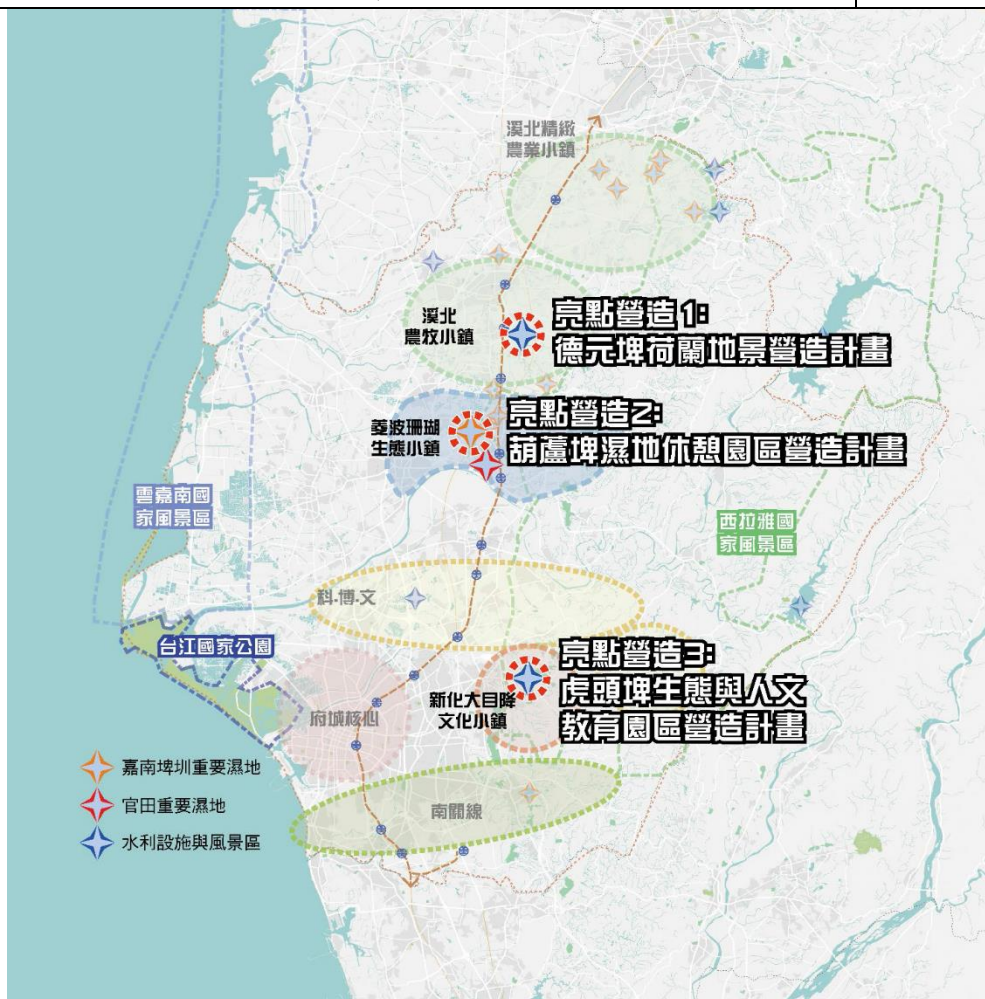

## 硬體計畫 一、德元埤荷蘭地景營造計畫

德元埤現況以荷蘭風車為園區整體營造方向呼應當地特色與荷蘭低地地景，強化荷蘭意象與水環境營造，因此規劃埤塘戲水區與親水休憩區提供不同年齡層與遊憩的使用者。埤塘休憩區東側鄰近水岸處設置草坪休憩區，製造寬廣的臨水空間提供多樣化的使用可能。此外，結合德元埤與老牛的家，增設互動牧場區與動物互動可能性，提升德元埤休憩機能的並在強化荷蘭意象。


| 計畫項目 | 內容                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫內容 | 1. 水道行船地景改善計畫<br>2. 互動牧場區營造計畫<br>3. 親水休憩區與埤塘戲水區環境改善計畫<br>4. 風車意象風景區景觀改善計畫<br>5. 露營區與樹林休憩區環境改善計畫 |
| 預估經費 | 90,000,000 元<br>中央補助款 49,725,000 元 地方自籌款 28,125,000 元                                           |
| 實施期程 | 4 年 (113-116)                                                                                   |



## 硬體計畫 二、葫蘆埤濕地休憩園區營造計畫

葫蘆埤屬於嘉南埤圳國家級重要濕地，鄰近水雉生態教育園區(官田國家級重要濕地)，葫蘆埤整體規劃以生態營造與環境教育為主軸，將埤塘水岸分為親水與生態兩種形式，以區分使用模式。在既有服務設施區域設置親水水岸提供旅客休憩、近水與垂釣等空間機能，並於其他區域種植挺水與浮水植栽，引入周邊生態系統提供生物棲地，並作為環境生態教育場域，以符合大規劃下的空間機能與強化官田地區生態特色。

| 計畫項目 | 內容                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫內容 | 1. 水岸與環埤塘步道整治計畫<br>2. 近水水岸休憩設施營造計畫<br>3. 近水休憩區與人文休憩區景觀營造<br>4. 水映南瀛遊憩指標系統建置計畫 |
| 預估經費 | 70,000,000 元<br>中央補助款 38,670,000 元 地方自籌款 31,325,000 元                         |
| 實施期程 | 4 年 (113-116 年)                                                               |

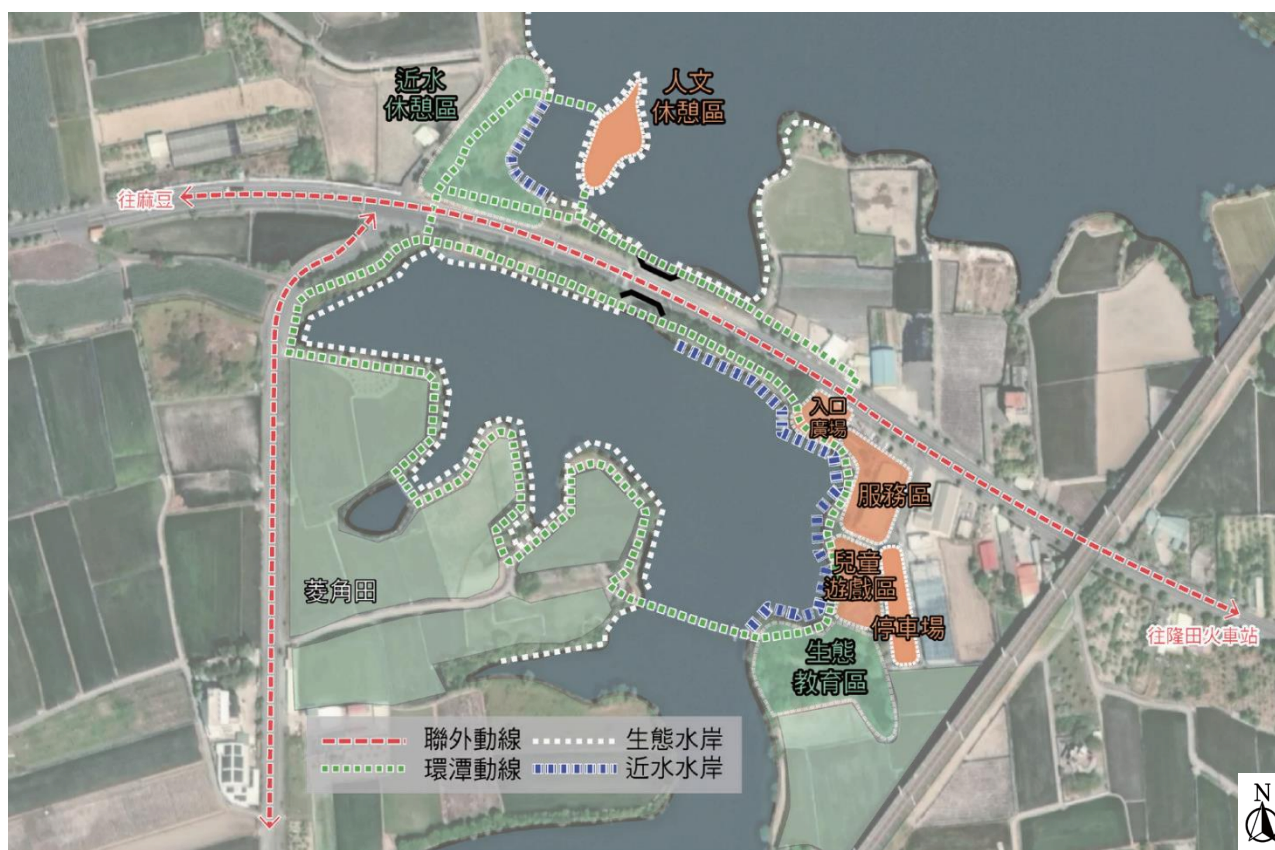

## 硬體計畫 三、虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫

虎頭埤一期前瞻建設「全齡遊憩場」成果卓越，本府透過本計畫經費全面性發展虎頭埤風景區，強化與完備虎頭埤休憩機能與多元服務，本計畫將使用者年齡層擴展，打造生態教育、露營服務機能活化、新化林場串聯等，打造結合環境地景、生態特色、更具符合全年齡層需求之休閒遊憩場域，並帶動大目降文化小鎮之觀光產業發展。

| 計畫項目 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫內容 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 虎頭山生態休憩區展望點改善計畫</li> <li>2. 生態環境教育區整體營造計畫</li> <li>3. 生態休憩步道串聯新化林場及周邊服務設施改善計畫</li> <li>4. 樹木療育區營造計畫</li> <li>5. 觀夕半島雙水亭意象營造計畫</li> <li>6. 露營區環境設施與景觀改善計畫</li> <li>7. 東北側管制設施暨景觀改善計畫</li> <li>8. 水岸休憩步道與自行車服務設施建置計畫</li> <li>9. 越野山徑環境改善計畫</li> <li>10. 虎頭埤環埤無障礙遊憩步道改善計畫</li> </ol> |
| 預估經費 | 220,000,000 元<br>中央補助款 121,550,000 元 地方自籌款 98,450,000 元                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 實施期程 | 4 年 (113-116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# 經費總表

單位：萬元

| 計畫總經費<br>(申請中央補助款+地方配合款+地方自償款) | 49,250 萬元 | 硬體     |           | 軟體     |           |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                |           | 金額     | 比例<br>(%) | 金額     | 比例<br>(%) |
|                                |           | 38,000 | 77%       | 11,250 | 23%       |
| 申請中央補助款                        | 29,995 萬元 | 20,995 | 55.25%    | 9,000  | 80%       |
|                                | 60.9%     |        |           |        |           |
| 地方配合款                          | 13,555 萬元 | 11,305 | 29.75%    | 2,250  | 20%       |
|                                | 27.5%     |        |           |        |           |
| 地方自償款                          | 5,700 萬元  | 5,700  | 15%       | —      | —         |
|                                | 11.6%     |        |           |        |           |

## 分年編列表

單位：萬元

|                  |        |        |          |         |        |
|------------------|--------|--------|----------|---------|--------|
| 硬體計畫             | 113年   | 114年   | 115年     | 116年    | 總計     |
| 德元埤荷蘭地景營造計畫      | 1,800  | 4,050  | 2,700    | 450     | 9,000  |
| 葫蘆埤濕地休憩園區營造計畫    | 1,400  | 3,150  | 2,100    | 350     | 7,000  |
| 虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫 | 4,400  | 9,900  | 6,600    | 1,100   | 22,000 |
| 小計               | 7,600  | 17,100 | 11,400   | 1,900   | 38,000 |
| 軟體計畫             |        |        |          |         |        |
| 永續旅遊目的地推廣計畫      | 210    | 245    | 210      | 35      | 700    |
| 埤塘露營地及水域休憩品牌營造   | 500    | 1,125  | 750      | 125     | 2,500  |
| 臺南旅宿市場及產業輔導升級    | 360    | 720    | 630      | 90      | 1,800  |
| 埤塘低碳電動遊園輔導計畫     | 190    | 95     | 617.5    | 47.5    | 950    |
| 埤塘觀光集客體驗活動計畫     | 600    | 300    | 1,950    | 150     | 3,000  |
| 埤塘觀光遊程及導覽建置計畫    | 160    | 80     | 520      | 40      | 800    |
| 工程專案管理及工作執行推廣計畫  | 450    | 525    | 450      | 75      | 1,500  |
| 小計               | 2,470  | 3,090  | 5,127.5  | 562.5   | 11,250 |
| 軟硬小計             | 10,070 | 20,190 | 16,527.5 | 2,462.5 | 49,250 |
